

REGIONE CALABRIA

COMUNE DI S. AGATA D'ESARO

PROVINCIA DI COSENZA

DIPARTIMENTO 5
INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'

D.L. n° 104 del 12/09/2013, convertito, con modificazioni dalla Legge n° 128 del 08/11/2013
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA.
AVVISO PUBBLICO per L'ACCESSO A FINANZIAMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA
approvato con decreto n° 1107 DEL 23/02/2015

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI PROPRIETA' COMUNALE

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI:

ING. Carlo BUFANO
ING. Gian Carlo RAIMONDO
ING. Francesca LAISE

COMMITTENTE:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ELABORATO :

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI


TAVOLA :

**PDE
20**

SCALA :

AGGIORNAMENTI :	DATA
Gennaio	2018

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

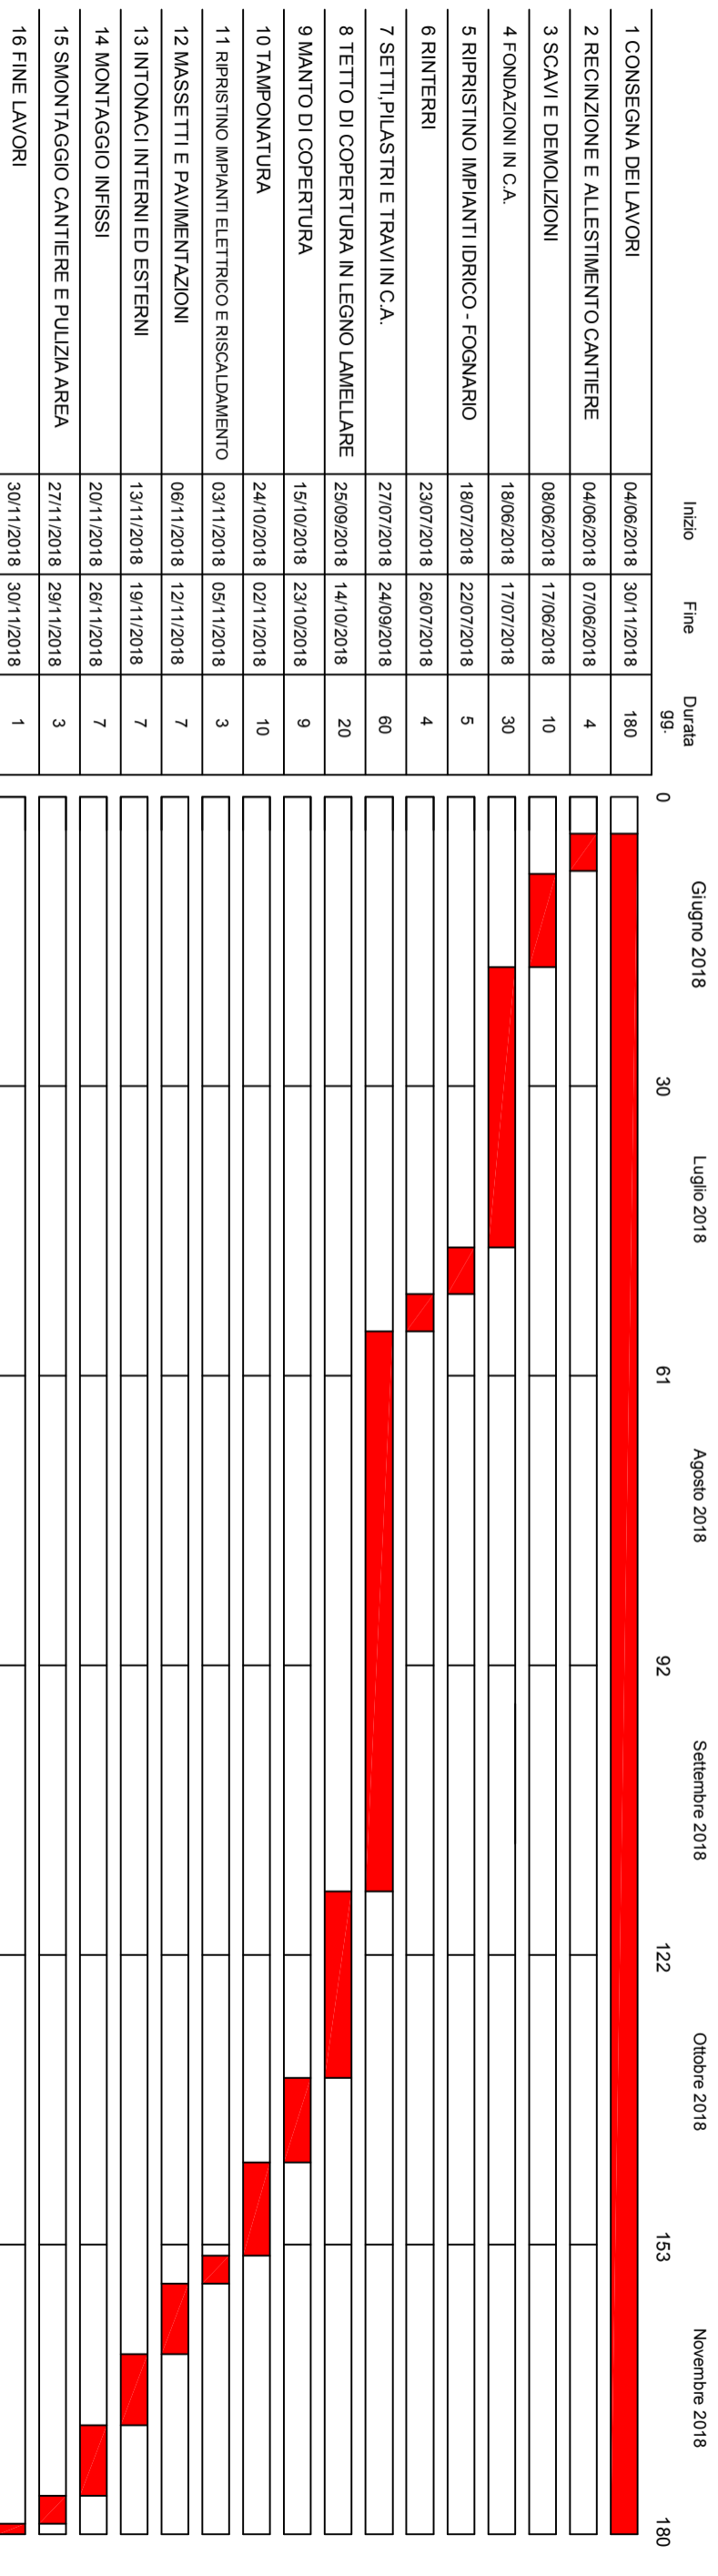

	Inizio	Fine	Durata gg.
1 CONSEGNA DEI LAVORI	04/06/2018	30/11/2018	180
2 RECINZIONE E ALLESTIMENTO CANTIERE	04/06/2018	07/06/2018	4
3 SCAVI E DEMOLIZIONI	08/06/2018	17/06/2018	10
4 FONDAZIONI IN C.A.	18/06/2018	17/07/2018	30
5 RIPRISTINO IMPIANTI IDRICO - FOGNARIO	18/07/2018	22/07/2018	5
6 RINTERRI	23/07/2018	26/07/2018	4
7 SETTI,PILASTRI E TRAVI IN C.A.	27/07/2018	24/09/2018	60
8 TETTO DI COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE	25/09/2018	14/10/2018	20
9 MANTO DI COPERTURA	15/10/2018	23/10/2018	9
10 TAMPONATURA	24/10/2018	02/11/2018	10
11 RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICO E RISCALDAMENTO	03/11/2018	05/11/2018	3
12 MASSETTI E PAVIMENTAZIONI	06/11/2018	12/11/2018	7
13 INTONACI INTERNI ED ESTERNI	13/11/2018	19/11/2018	7
14 MONTAGGIO INFESSI	20/11/2018	26/11/2018	7
15 SMONTAGGIO CANTIERE E PULIZIA AREA	27/11/2018	29/11/2018	3
16 FINE LAVORI	30/11/2018	30/11/2018	1
